

Plan de charge V1, vue par jour

12 semaines (60 jours ouvrés), du lancement à la mise en production et au début des tests terrain. Chaque barre correspond à une tâche du backlog.

Début

Fin de fenêtre

Durée

Budget V1 firm

Équipe

Prestataire

Décision en attente

Diffusion

lun. 17 août 2026

ven. 6 nov. 2026

60 j ouvrés · 6 sprints

50 j-h


2 dev fullstack · lead 20% · PO 30%

Etech

biométrie YAS

Confidentiel

Backend / APIAdmin (front)PWA terrainCadrage / Ops / QA / DocPoint de vigilanceMarge / contingenceJalonJalon majeur

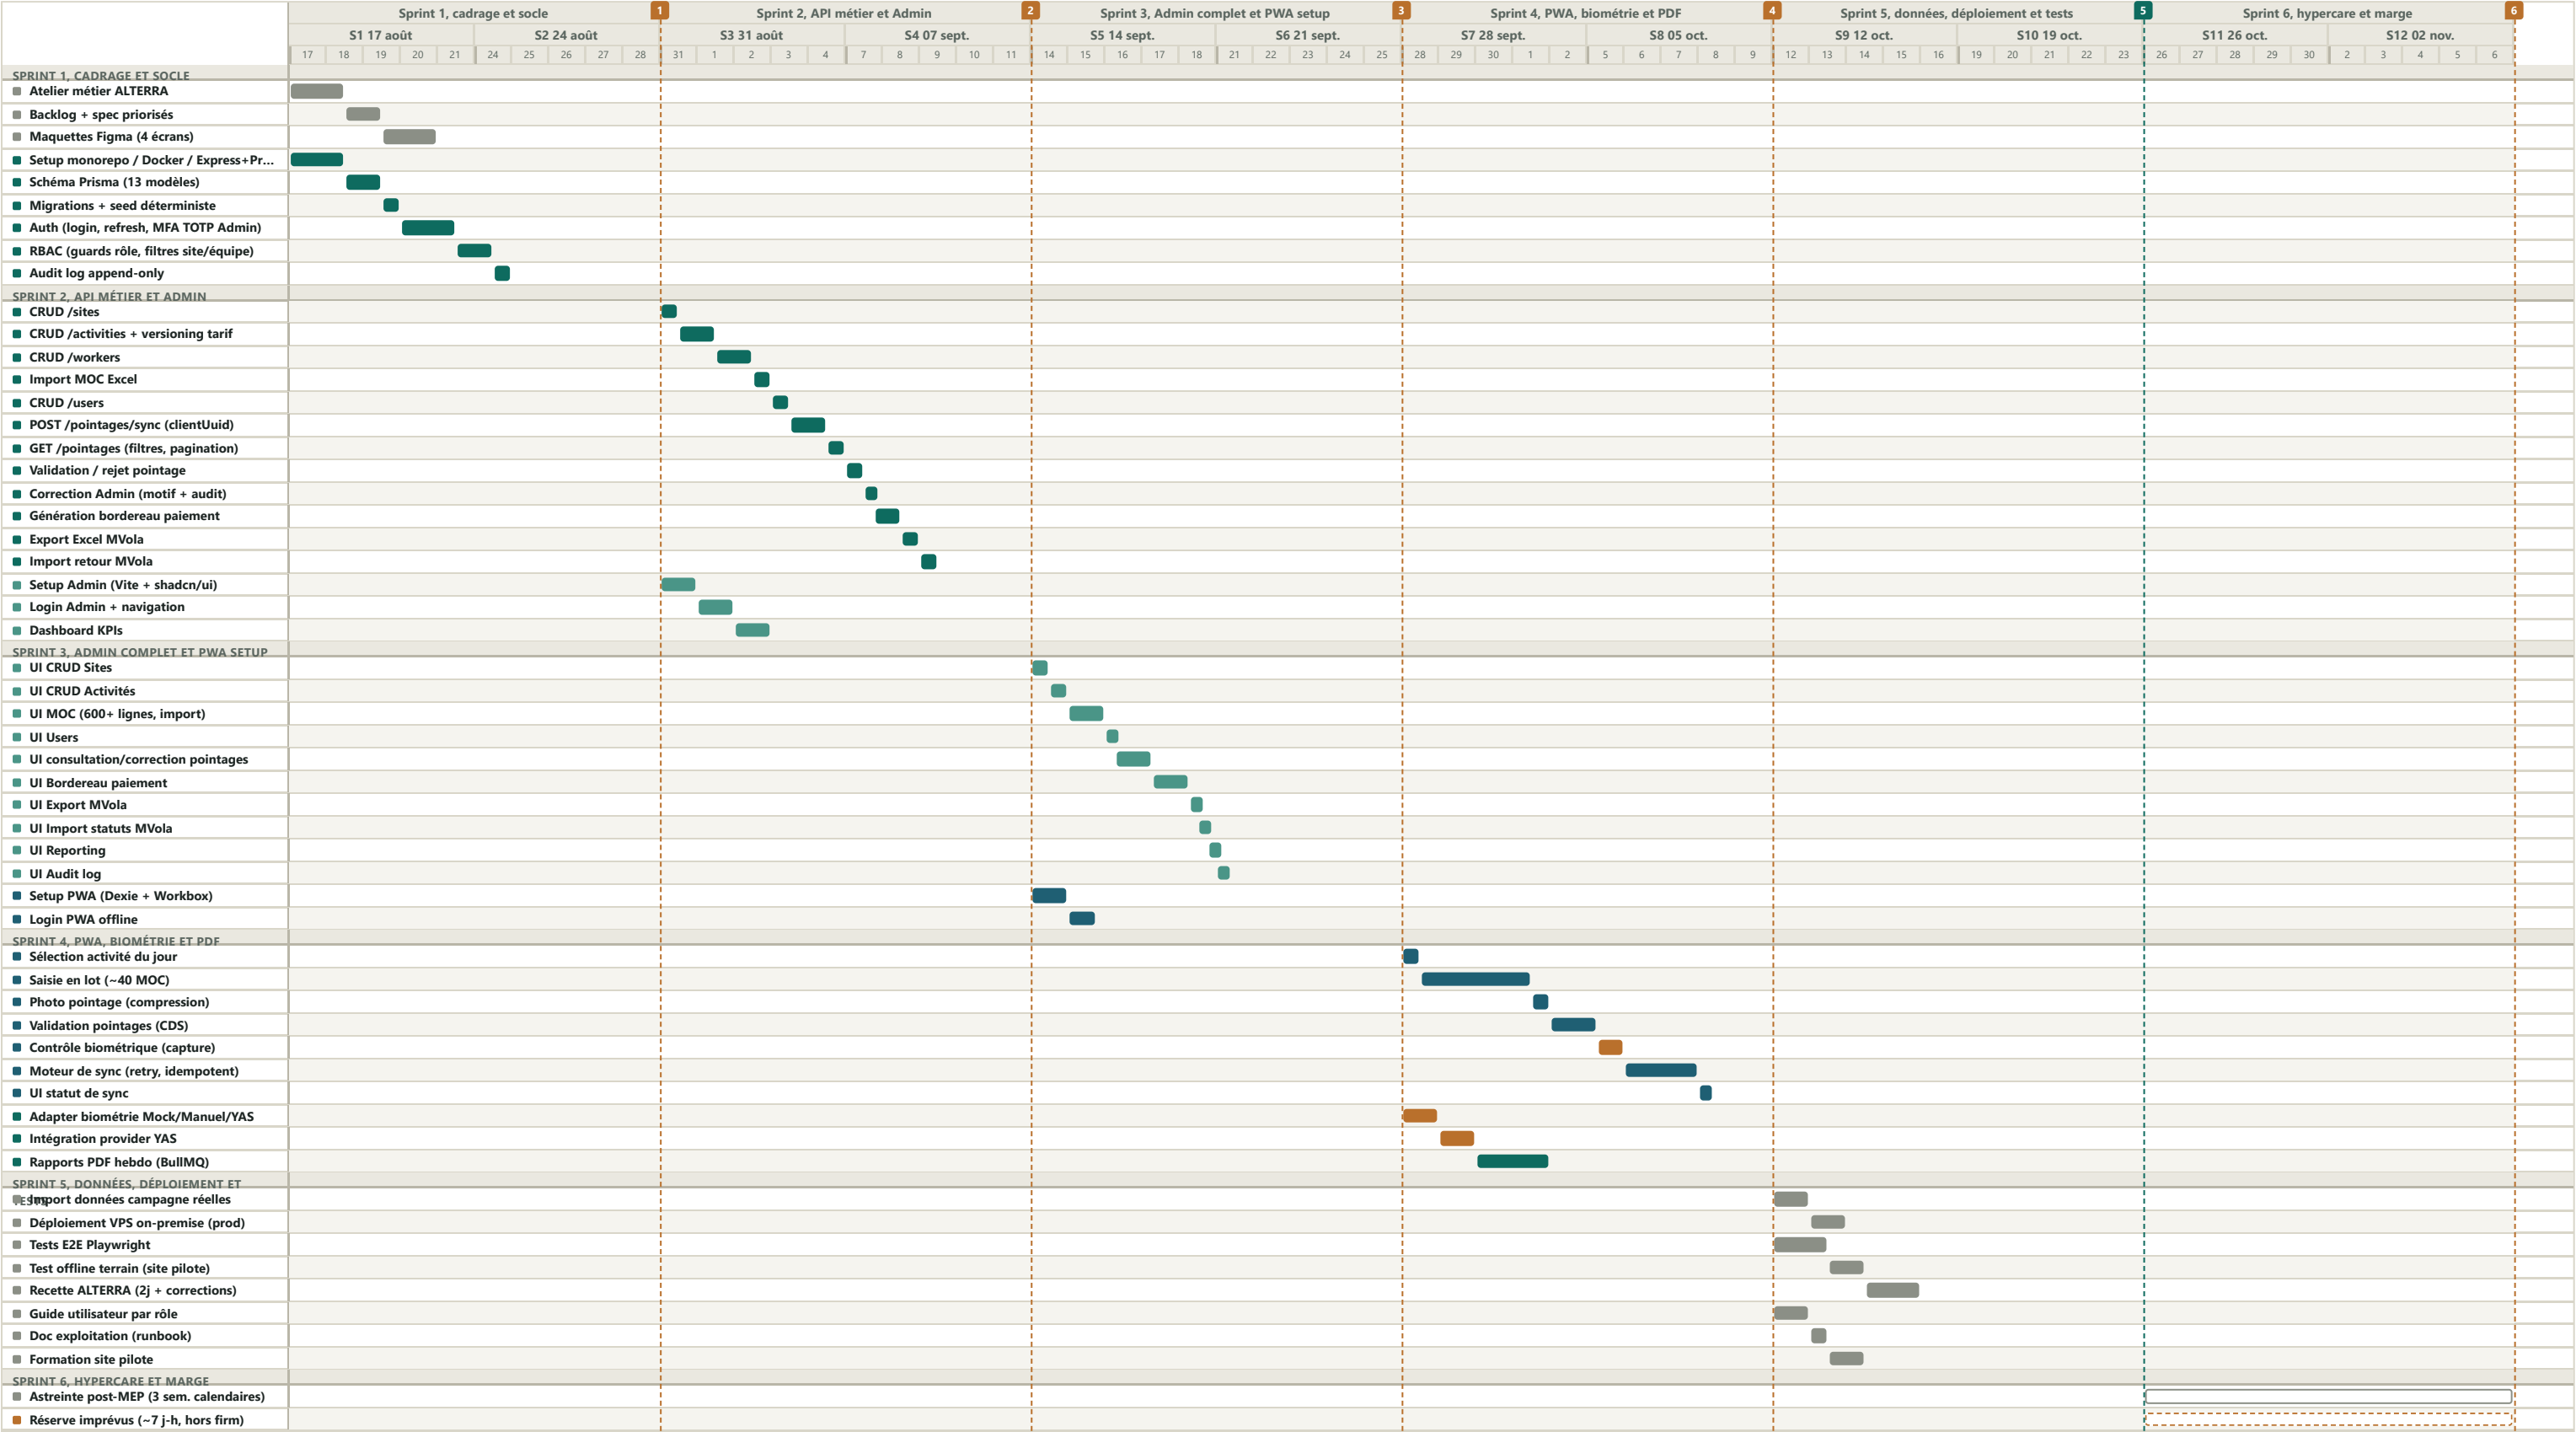

Jalons

JALON	DATE	CONDITION / DÉPENDANCE	
1	Cadrage validé, socle technique en place	ven. 28 août	Échantillon Excel MVola obtenu (condition de réussite Sprint 1)
2	API métier V1 complète, Admin démarré	ven. 11 sept	
3	Admin back-office fonctionnel complet	ven. 25 sept	
4	PWA complète, biométrie intégrée	ven. 9 oct	Réponses YAS aux questions 01 et 02 (format intent, callback signé) reçues avant Sprint 4, sinon bascule mode manuel
5	Mise en production + début des tests terrain	ven. 23 oct	VPS provisionné avant Sprint 5 · données initiales Excel propres
6	Fin de la fenêtre 12 semaines	ven. 6 nov	Hypercare engagée le 23 oct, voir note ci-dessous si les 3 semaines pleines sont maintenues

Pourquoi ce séquençement

Backend d'abord (auth, référentiels, pointages, paiements), puis Admin, puis PWA en dernier bloc métier : le moteur de sync et la saisie terrain dépendent d'une API pointages stable. Biométrie et rapports PDF sont regroupés en Sprint 4 car les deux sont des flux asynchrones, pas des CRUD.

Décision biométrie à trancher avant Sprint 4

Le flux Intent APK proposé le 6 août n'est pas encore intégré à l'architecture cible : 2 questions bloquantes restent ouvertes côté YAS (format de l'intent, callback signé côté serveur). Sans réponse avant fin Sprint 3 (25 sept.), Sprint 4 bascule sur le mode manuel pour tenir la date du jalon 4.

Fenêtre hypercare vs 12 semaines

Le backlog prévoit 3 semaines d'astreinte post-MEP. La mise en production a lieu le 23 oct. et la fenêtre s'arrête le 6 nov., soit 2 semaines pleines dans ce budget. Le déploiement et le début des tests terrain restent bien dans les 12 semaines ; seule la fin de l'astreinte déborderait d'une semaine si les 3 semaines complètes sont maintenues.

Sources : docs/architecture-cible-ALTERRA.pdf (v1.2, 13/08/2026) · docs/cadrage/backlog-moscow.md · docs/superpowers/plans/2026-07-21-alterra-backlog-complet.md · docs/cadrage/biometrie-v2-intent-apk.md. Une tâche placée dans un sprint démarre au plus tôt le premier jour de ce sprint ; l'enchaînement à l'intérieur d'une piste est séquentiel, les pistes tournent en parallèle.
